



Samsvarserklæring for Function Heat: Varmekabel

Function AS

Jørgen Kanitz' gate 28, 1337 Sandvika

function.no

Skjema kan også fylles ut på varmekabel.function.no for utvidet systemgaranti ved registrering.

1. Installasjon skal utføres iht produktets monteringsanvisning og utføres av autorisert elektroinstallatør.
2. Ferdig utfyllt skjema leveres kunde og/eller legges i boligmappa.no eller tilsvarende.
3. Før, under og etter installasjon av Function Heat: Varmekabel og kabelmatte skal produktet kontrollmåles og verdier noteres i skjemaets riktige felt. Du finner alle måleverdier på produktets merkelapp. Avvik tolereres med -5/+ 10% av nominell verdi på produksjonsmerkelapp.
4. A) Ved montering av Function Heat: Varmekabel skal det testes isolasjonsmotstanden mellom lederen og jord på kabelen. Måleverdien må ikke være mindre enn 1 M-Ohm og skal registreres i garantidokumentet. Det skal benyttes megger med en nominell spenning på 500 volt for installasjoner inntil 500V(AC) og megger med 1000 volt nominell spenning på installasjoner med driftsspenning over 500V(AC)
B) Ved montering av kabelmatter / varmekabel der det ikke er beskyttelsesskjerm er det nødvendig å teste lekkasjestrøm. Måleverdien må ikke være høyere enn 3,5 mA på kabel opptil 3000 W effekt, og ikke høyere enn 7 mA på kabel med effekt 3000 W eller mer. Måleverdien skal registreres i garantidokumentet nedenfor.

EL.NR.:	PRODUKSJONSDATO SERIENUMMER:	KJØPSDATO:
---------	---------------------------------	------------

PRODUKTDATA

PRODUKTNAVN:	TOTAL EFFEKT: W	RESISTANS:	LENGDE: m
SPENNING: V	EFFEKT: m ²	Ω	ROMAREAL: m ²

MÅLERESULTAT FØR LEGGING AV PRODUKTET:

RESISTANS: Ω	DATO:	SIGNATUR:
RESISTANS MOT JORD: MΩ		
LEKKASJESTRØM: mA		

INSTALLASJONSOMRÅDE

☐ BETONG ☐ RØR ☐ JORD ☐ ANNET ☐ TAK/
TAKRENNER ☐ LAVTBYGGENDE
GULV ☐ SNØSMELTING

MÅLERESULTAT ETTER LEGGING AV PRODUKTET:

RESISTANS: Ω	DATO:	SIGNATUR:
RESISTANS MOT JORD: MΩ		
LEKKASJESTRØM: mA		

MÅLERESULTAT ETTER STØP AV GULV

RESISTANS: Ω	DATO:	SIGNATUR:
RESISTANS MOT JORD: MΩ		
LEKKASJESTRØM: mA		


INSTALLATØROPPLYSNINGER:

FIRMA:
ADRESSE:
TLF.:
ANSVARLIG MONTØR:

Tegning side 2.

Tegning av installasjon eller bilder settes inn på side to eller legges ved dette dokumentet, sammen med en installasjonsbeskrivelse.

Skisse av elementplassering, soner og koblingspunkter eller bilde av installasjon inkl. plassering av gulvfører

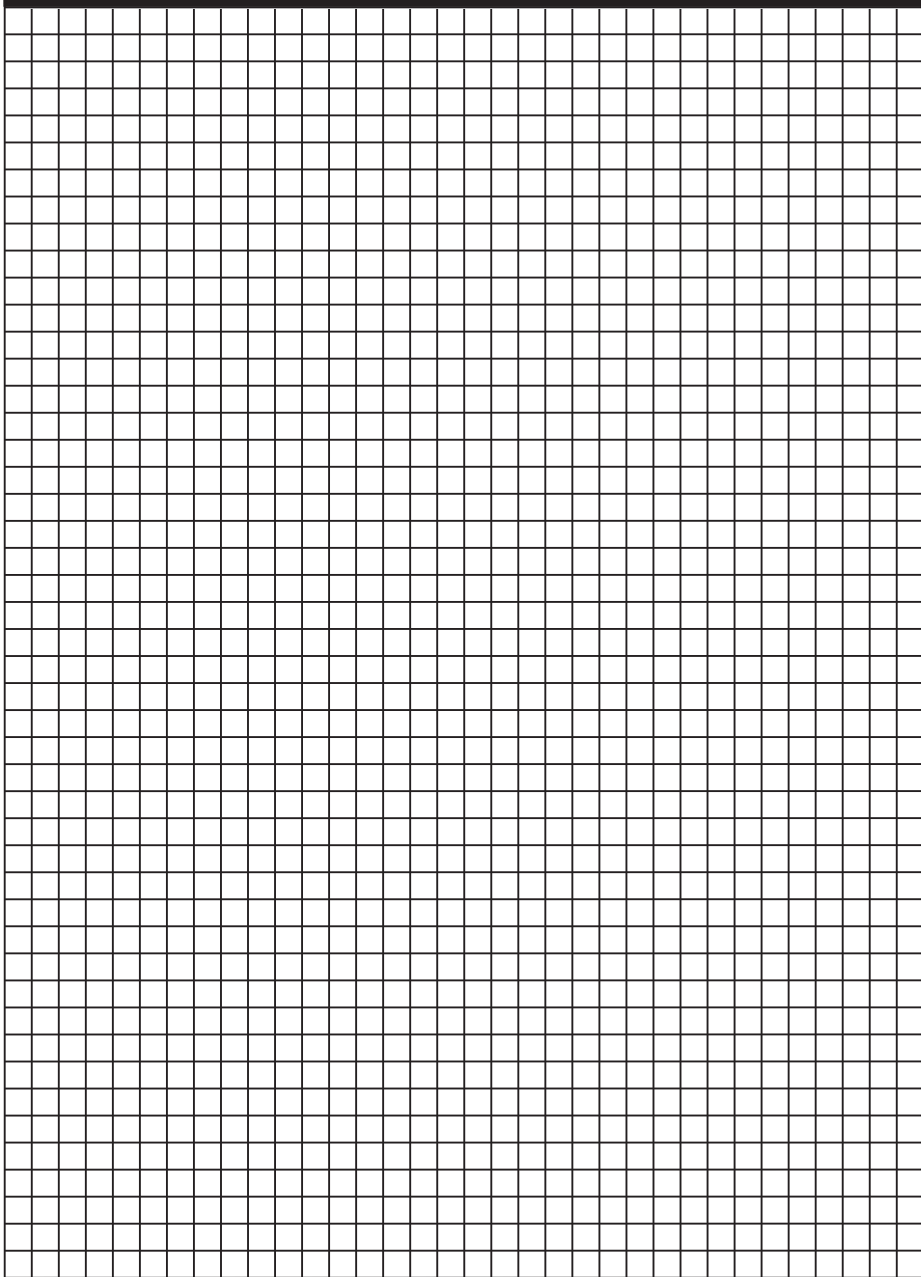

ADVARSEL!
CAUTION!
POZOR!
ATENCIÓN!

ACHTUNG!
ATTENTION!
ВНИМАНИЕ!
UWAGA!



Advarsel: Blir gulvet tildekket av tykke tepper, madrasser, kompakte møbler e.l. kan dette skade gulv og varmeelement
